특수공시 사업내역

(단위:억원)

연번	사 업 명	사 업 개 요	총사업비	'12까지 투자비	비고
1	경상북도 본청 및 의회 신청사 건립	• 기 간 : 2011~2014 • 위 치 : 안동시 풍천면 갈전리 일원 • 규 모 : 부지 245천㎡, 연면적 143천㎡	4,055	1,492	
2	경상북도문화콘텐츠 진흥원 건립	• 기 간 : 2009~2012 • 위 치 : 안동시 동부동 123-1 • 규 모 : 부지 1,662㎡, 연면적 4,377㎡	194	194	
3	국립 낙동강 생물자원관 건립	• 기 간 : 2009~2013 • 위 치 : 상주시 도남동 산39 • 규 모 : 부지 123,592㎡, 연면적 23,188㎡	922	660	
4	제4세대 방사광 가속기 건립	• 기 간 : 2011~2014 • 위 치 : 포항가속기연구소 일원 • 내 용 : 0.1mm급 제4세대 방사광 가속기 개발 등	4,260	650	
5	농암~산양간 도로 건설공사	• 기 간 : 2011. 9. ~ 2017. 9 • 위 치 : 문경시 농암면 사현리~상주시 함창읍 교촌리(국지도32호) • 규 모 : L=13.0㎞(B=11.5m 2차로) - 터널 2개소 L=951m	59,215	13,731	
6	부자마을만들기사업	• 기 간 : 2008 ~ 계속 • 위 치 : 23개 시군 • 내 용 : 지역자원활용 제조·가공 유통, 관광·체험 등 공동소득화 사업 추진	425	313	
7	청도~경산 4차로 확장공사	• 기 간 : 2004~2014 • 위 치 : 청도 금천면~경산 자인면 • 사업량 : L=16.8km, B=20m(4차로)	1,280	1,084	
8	지방어항건설	• 기 간 : 계속사업 • 대상지 : 지방어항 23개소 • 내 용 : 방파제 및 물양장 신설 어항시설 보강 등	2,538	2,110	
9	자연재해위험지구 정비사업	• 기 간 : 1998~2015 • 대 상 : 16개시군, 257지구 • 내 용 : 하천개수, 저지대 배수장 설치	12,569	6,304	
10	도시 주거환경개선	• 기 간 : 2001~2013 • 대 상 : 10개시, 60지구 • 내 용 : 도로개설, 상하수도 설치 등	2,826	2,717	

1 경상북도 본청 및 의회 신청사 건립

- 공공청사의 랜드마크 ⇒ 세계적인 관광명소화 -

○ 경북의 얼이 깃든 상징성과 실용성을 기본 이미지화하여 역사·문화 전통과 현대가 공존하는 우아함을 가미한 건축디자인

○ 저탄소 녹색성장과 유비쿼터스 등이 접목된 실용적 최첨단 녹색청사 건립

❑ 사업개요

- 위　　치 : 안동시 풍천면 갈전리 일원
- 규　　모 : 부지 245,000㎡, 연면적 143,059㎡ (지하 2/지상 7층)
  - 본청 46,640, 의회 11,623, 주민복지 39,274, 주차장 44,372, 기타 1,150
- 총사업비 : 4,055억원(청사건축 3,184, 부지 871)
- 사업기간 : 2011. 10 ~ 2014. 10 (총37개월)

❑ 추진상황

- 청사건축 타당성조사용역 완료('09. 8)
- 도본청 및 의회청사 기본계획수립 용역('10. 8)
- 설계·시공 일괄입찰 기본설계 적격심의 및 낙찰자 결정('11. 2)
- 책임감리용역 낙찰자 결정('11. 3)
- 도본청 및 의회청사 실시설계 완료('11. 7)
- 건설기술심의위원회 실시설계 적격심의 및 최종낙찰자 결정('11. 9)
- 도본청 및 의회청사 건립공사 착공('11. 10)
- 지장물 철거 및 부지정지, 현장사무소 설치('11. 12)
- 본관5층 바닥 및 의회 지붕층 골조공사 추진중/공정율 38%('13. 7현재)

※ 신청사 준공 및 입주('14. 10)

❑ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분		계	2009	2010	2011	2012	2013	2014
계		4,055	100.5	41.5	450	900	1,056	1,507
건축비 (3,184)	국 비	1,514	100	40	250	400	506	218
	도 비	1,670	0.5	1.5		250	300	1,118
부지매입	도 비	871			200	250	250	171

❑ 기대효과

- 한국적 이미지와 정체성을 담은 저탄소, 에너지 절감형 청사건립을 통한 녹색건축의 선진모델 정립
- 행정기능의 효율성과 미(美)를 결합한 국제적 품격의 청사건립으로 경북의 대표적 랜드마크로 명소화하고, 질 높은 행정서비스 실현

❑ 신청사 조감도

2 경상북도문화콘텐츠진흥원 건립

○ 문화콘텐츠 산업관련 네트워크 형성과 경북문화산업의 중추기능
○ 도내 문화콘텐츠산업체의 지원·육성을 통한 문화산업 및 지역경제 활성화 도모

❑ 사업개요

- 위　　치 : 안동시 동부동 123-1 (구)안동문화회관
- 사업기간 : 2009~2012(4년간)
- 사업규모 : 부지 1,662㎡, 건물연면적 4,377㎡(지하 1/지상 6층)
- 총사업비 : 194억원(국비 77, 도비 38, 시군비 79)
- 주요시설 : 창조아트실, 첨단강의실, 창조라키비움, 콘텐츠개발지원실, 첨단제작스튜디오실 등

❑ 추진실적

- 국비(균특) 신규사업 확정('08. 12)
- 부지매입 및 건축설계경기 공모('09. 4)
- 기본 및 실시설계 용역 발주('09. 11)
- 설계용역 완료('10. 8)
- 공사착공 및 건축공사('10. 11 ~ '13. 2)
- 경북문화콘텐츠진흥원 설립 및 운영조례 제정
  ※ 경북문화콘텐츠진흥원 건물 준공('13. 2)
- 경북문화콘텐츠진흥원 개원식 : 2013. 4. 25

❑ 주요기능

- 지역문화산업 육성을 위한 시책개발 및 지원활동
- 문화콘텐츠산업 촉진을 위한 기술개발 및 전문인력양성

❑ 조감도 및 준공사진

3 국립 낙동강생물자원관 건립

○ 영남권 생물자원의 조사·발굴 및 담수생물의 특성화 연구와 다양한 교육·전시의 장을 마련, 생물자원의 중요성에 대한 국민인식 증대

❑ 사업개요

- 위　　치 : 경북 상주시 도남동 산 39-2번지 일원
- 사업기간 : 2009년~2013년(5년)
- 사업규모 : 부지 123,592㎡(37천평), 건축연면적 23,459㎡(지하1층, 지상3층)
- 총사업비 : 922억원(국비)
- 사업내용 : 수장·연구시설, 전시·교육시설, 연구온실 및 사육실, 전시온실, 게스트 하우스 등

❑ 추진상황

- 기본계획 수립용역 완료('08.11, 환경부)
- 기본 및 실시설계 용역 ('09.1~'10.8, 환경부)
- 기획재정부 예비타당성조사 결과 타당성 인정('09.8)
- 건립부지 매입완료('09.10) 및 문화재지표조사 용역 완료('09.12)
- 전시물 설계 및 제작 설치 용역('10.9~'12.12)
- 착공('11.5)　○ 토목·건축공사('12~'13 , 공정율 90%)
- 준공및 인수인계('13.7~8), 임시운영 및 개관 준비 착수('13.9~)

※ 개관 ('14. 5)

❑ 기대효과

- 국민의 생물자원에 대한 인식 증대
- 생태관광 거점 인프라 구축으로 지역경제 활성화
- 우수 생물자원에 대한 체계적 연구를 통한 생물종 다양성 확보

❑ 국립 낙동강생물자원관 조감도

4 제4세대 방사광가속기 건립

○ 기초 및 응용과학분야의 핵심, 원천기술 개발을 위한 첨단 연구 기반 구축으로 세계 최고 수준의 연구성과 창출

○ 선진국 추격형이 아닌 선도형 연구개발 기반 구축 사업으로 추진, 기초·응용과학 기술 선점 및 미국, 일본에 이어 월드 Top 3 경쟁력 확보

❑ 사업개요

- 대상지역 : 포항가속기 연구소 일원
- 사업기간 : 2011~2014(4년간)
- 사업내용
  - 0.1nm급 제4세대 방사광 가속기 개발 및 빔라인 구축(국비)
  - 가속기 체험관, 게스트 하우스, 과학영재프로그램 등 연계사업(지방비)
- 총사업비 : 4,260억원(국비 4,000, 도 130, 포항시 130) ※ 부자기반시설 포스텍 제공

❑ 투자내역

(단위 : 억원)

구 분		총사업비	2011년까지 투자	2012	2013	2014이후
계		4,260	200	450	1,070	2,540
국 비		4,000	200	450	1,050	2300
지방비	도 비	130			10	120
	포항시	130			10	120

❑ 추진현황

- '08. 6 : 제4세대 방사광가속기 건설 제안서 제출(포스텍→교과부)
- '08. 12 : 4세대 가속기 개념설계 완료
- '09. ~ '10 : 전문가 대상 토론회 개최(총7회)
- '10. 8. 30 : 국가 예비타당성 조사 통과(기획재정부, KDI)

  ※ B/C : 0.85, AHP : 0.575, 경제성, 기술적 타당성, 정책적 타당성 인정
- '12. 8 : 토목·건축 시공사 선정(포스코건설 컨소시엄)
- '12. 9 : 공사착공(기공식 '13. 5. 9)
- 2012년 까지 : 650억원(국비)
  - 토목공사, 건축공사(15%), 가속기 개발(입사기, 가속장치 등)

❑ 향후계획

- **2013까지 : 1,720억원(국비 1,700, 지방비 20)**
  - 토목공사·건축공사(70%), 가속기 본제품 발주(입사기, 가속장치 등)
  - 4세대 가속기 연계사업 설계 및 감리 용역 발주
- **2014계획 : 2,540억원(국비 2,300, 지방비 240)**
  - 건축공사(100%), 빔라인 구축 및 가속장치 설치 완료
  - 연계시설(체험관, 이용자숙소) 공사 발주 및 착공·준공
  - 시험운전, 연계사업 개관, 거대과학영재프로그램 운영

❑ 기대효과

- 기초과학 및 응용과학분야의 핵심·원천기술 개발을 위한 세계수준의 지식경쟁력 창출 및 가속기클러스터 조성으로 과학역량 제고
- 선진국 추격형에서 선도형 사업으로 세계 과학기술 경쟁대열에 합류하여 첨단과학기술의 선점과 글로벌 수준의 연구 성과 창출 기여

❑ 조감도

5 농암~산양간 도로건설공사

○ 선형불량 및 겨울철 상습결빙구간 정비로 농산물 수송원활 및 지역 주민 숙원사업 해소 및 지역균형 발전

❑ 사업현황

- 위　　치 : 문경시 농암면 사현리 ~ 상주시 함창읍 교촌리(국지도 32호선)
- 사 업 량 : L=13.0㎞(B=11.5m 2차로) - 터널 2개소/951m
- 사 업 비 : 592억원 (도급 347 관급 103 보상비 76 기타 66)
- 사업기간 : 2011. 09. 28 ~ 2017. 09. 25(6년)

❑ 추진현황

- 2012년 까지
  - 사 업 비 : 137억원(도급 59 관급 4 보상비 51 기타 24)
  - 사 업 량 : L=2.84km, 현장사무실, 토공, 터널공 등 1식
  - 사업기간 : 2011. 9. 28 ~ 2013. 7. 82
- 2013년 시행(3차)
  - 사 업 비 : 104억원(도급 54 관급 16 보상 24 기타 10)
  - 사 업 량 : L=2.28km, 토공, 구조물공(교량), 터널공 등 1식
  - 사업기간 : 2013. 4. 26 ~ 2014. 4. 25
- 2014년 이후
  - 사 업 비 : 351억원(도급 234 관급 84 보상 1 감리등 32)
  - 사 업 량 : L=7.88km, 토공, 구조물공(교량), 터널공 등 1식

❑ 위 치 도

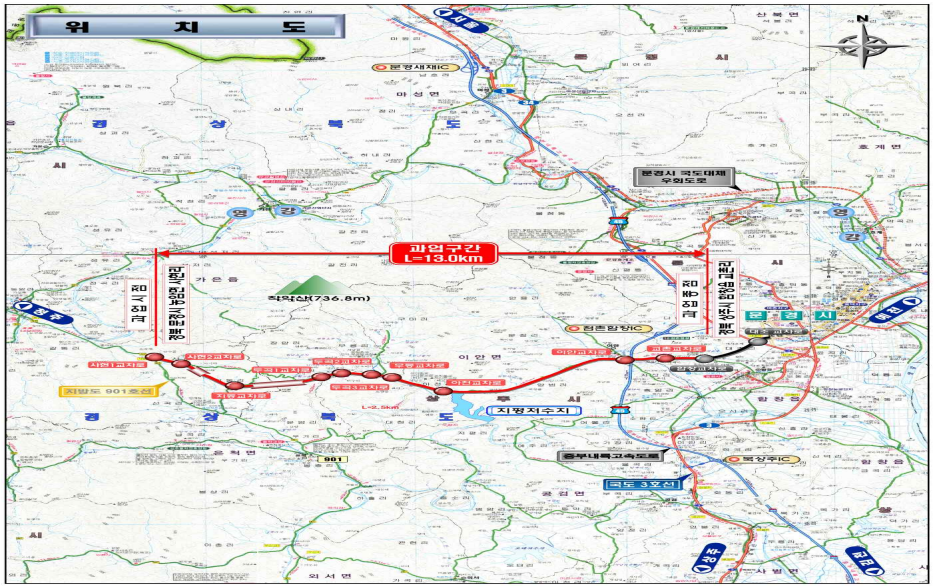

6 부자마을만들기사업

○ 급변하는 국내외 농어업 환경 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 새로운 전략사업 추진 필요

○ 농업·농촌이 지닌 다양한 잠재력을 극대화할 수 있는 지역공동체소득육성 사업을 추진함으로써 도시민 평균소득 상회하는 부자 농어촌 실현

❑ 사업개요

- 대상지역 : 23개 시·군
- 사업기간 : 2008~(2011년부터 국비사업으로 전환)
- 사업내용 : 소득증대 관련 사업 포괄 지원
  - 농산물 제조·가공·유통, 관광·체험, 홍보 및 마케팅, 역량강화 등
- 사 업 비 : 개소당 10억원 이내
- 지원대상 : 마을·읍면 20농가 이상 참여 마을조직, 생산자 단체 등
- 총사업비 : 425억원(국비 121, 도 76, 시군 143, 자부담 85)

❑ 투자내역

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2011년까지 투자	2012	2013	2014이후
계	425	279	34	42	70
국 비	121	48	17	21	35
도 비	76	63	3	4	6
시군비	143	112	7	9	15
자부담	85	56	7	8	14

❑ 추진현황

- 2008년 : 안동 풍천참외마을소득육성 등 9개사업(61억원) 추진
- 2009년 : 포항 상옥친환경농산물유통시설 등 9개사업(73억원) 추진
- 2010년 : 의성 구천사과브랜드화사업 등 7개사업(50억원) 추진
- 2011년 : 영주 저품사과부가가치제고사업 등 11개사업(95억원) 추진
- 2012년 : 김천 지역특화작목가공유통시설 등 4개소(34억원) 추진

❑ 향후계획

- **2013까지 : 355억원(국비 86, 지방비 198, 자부담 71)**
  - 40개소, 1시군 2개 마을 이상 부자마을만들기사업 추진
- **2014년 계획 : 70억원(국비 35, 지방비 21, 자부담 14)**
  - '14년 7개소, '20년까지 150개 사업 시행

❑ 기대효과

- 지역에 산재된 다양한 재원을 활용한 1·2·3차 융복합화로 소득자원화 하는 등 농업의 자생력 강화 및 지역농촌경제 활성화에 기여
- 지방과 중앙정부의 농촌지역 및 소득개발사업간 통합 연계추진으로 사업간 시너지 효과 극대화로 지역농업 거점 마을 육성

❑ 관련 사진 자료

< 마을주민 공동작업 장면 >

< 가공시설 준공식 장면 >

7 청도~경산간 도로4차로 확장공사

○ 간선 도로망 확충으로 교통의 지·정체 해소 및 지역균형개발촉진

❑ 사업개요

- **사업기간** : 2004. 4. 12 ~ 2014. 12. 31
- **위 치** : 청도군 금천면 동곡리 ~ 경산시 자인면 북사리(국지도69호선)
- **사 업 량** : L=16.825km, B=20.0m (4차로)
- **사 업 비** : 1,280억원(공사비687, 보상비527, 감리비31, 기타35)

❑ 추진현황

- **2012년 시행(11차)**
  - 공사기간 : 2012. 3. 23 ~ 2013. 3. 22
  - 사 업 비 : 54억원(공사비50, 감리비 4)
  - 사 업 량 : L=1.90㎞, 토공, 배수공, 포장공
- **2013년 계획**
  - 사 업 량 : L=1.31㎞, B=20.0m (교차로5개소)
  - 사 업 비 : 100억원(공사비 98, 감리비2)
- **2014년 이후**
  - 사 업 량 : L=0.99㎞, B=20.0m (교차로3개소)
  - 사 업 비 : 95억원(공사비 95)

❑ 사업장 위치

8 지방어항건설

○ 지방어항개발을 통해 자연재해로부터 어민의 재산과 생명을 보호하고 어업생산성 증대 및 소득 수준향상에 기여

❑ 사업개요

- 어항수 : 지방어항 23개항(포항8, 경주 3, 영덕 6, 울진 3, 울릉 3)
- 사업내용
  - 어항개발(방파제 및 물양장 신설)
  - 유지관리(시설 보수 및 보강)
- 총사업비 : 2,538억원(국비 819, 지방비 1,719)

❑ 투자내역

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2011년까지 투자	2012	2013	2014이후
계	2,538	1,996	114	101	327
국 비	819	600	31	38	150
지방비	1,719	1,396	83	63	177

❑ 추진실적

- 기 완공 : 10개항(모포, 발산, 지경, 전촌, 가곡, 경정, 백석, 노물,직산,통구미항)
- '12 완공 : 6개항(삼정, 방석, 대보, 기성, 골장, 천부항)

❑ 향후계획

- **2013 추진 : 101억원(국비 38, 지방비 63)**
  - 어항개발 : 3개항(병곡항, 나정항, 태하항)
  - 어항보강 : 11개항(이가리항, 가곡항, 경정항, 백석항 등)
- **2014 이후 : 327억원(국비 150, 지방비 177)**
  - 어항개발 및 보강

❑ 기대효과

- 어업기반시설의 조기 완공으로 수산업의 경쟁력을 강화 및 어민 소득 증대에 기여하고, 자연재해로부터 어민의 재산과 생명을 보호

❑ 현황사진

9 자연재해위험지구 정비사업

○ 침수위험지역 등 재해발생 우려지역을 자연재해위험지구로 지정고시
○ 반복되는 수해피해 재발방지를 위한 개량복구사업 확대

❑ 사업개요

- 위　　치 : 포항시외 16개 시군(257지구)
- 사업기간 : 1998. 1. 1 ~ 2015. 12. 31
- 사 업 비 : 12,569억원(국비 6,063, 도비 1,205, 시군비 및 기타 5,301)
- 사업내용 : 하천개수, 산사태예방, 저지대 배수장 설치 등

※ 시장·군수가 지정·고시 → 도 및 중앙보고 → 소방방재청에서 연차계획 수립 사업 추진

❑ 투자내역

- 2011까지 : 5,711억원(국비 1,951, 지방비 1,271, 기타 2,489)
- 2012년도 : 593억원(국비 505, 지방비 337)

❑ 추진실적

- 2011까지 : 119지구 하천개수 및 배수펌프장 설치
- 2012년도 : 32지구
  - 배수펌프장 5개소, 하천개수 15개소/L=43.3㎞, 교량개체 14개소, 피암터널 0.3㎞, 우수관거설치 등

❑ 사업효과

- 재해위험요인의 근원적 해소를 통해 도민의 재산과 생명 보호

❑ 사업장 전경사진

경산시 금락지구 사업전

경산시 금락지구 (공사중)

10 도시주거환경개선 사업

○ 도심지 노후·불량주택이 밀집되어 주거환경이 열악한 지역에 도로, 상·하수도 등 공공기반시설 확충 및 주택개량으로 쾌적한 도시 환경 조성

❑ 사업개요

- 위　　치 : 10개시 60개 지구
- 사업내용
  - 도로개설, 상하수도 확충등 공공기반시설 설치
  - 노후불량 주택개량 등
- 총사업비 : 2,826억원(국비 1,458,지방비 1,368)
- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2013. 12

❑ 추진상황

- 1 단 계('01~'05년) : 9개시 21지구 644억원(사업완료)
- 2 단 계('05~'13년) : 10개시 39지구 2,182억원(추 진 중)
  - 완　　료 : 10개시 22지구 1,747억원
  - 공 사 중 : 7개시 17지구 326억원
- 2013 추진 : 3개시 6지구 109억원(국비 64, 도비 14, 시비 31)

❑ 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2011	2012	2013	2014
계	282,575	190,069	41,144	40,454	10,908	3단계
국 비(50%)	145,786	96,627	21,616	21,132	6,411	
지방비(50%)	136,789	93,442	19,528	19,322	4,497	

❑ 기대효과

- 도시내 주거환경이 열악한 지역에 생활형 기반시설정비, 주택개량, 커뮤니티 설치 등으로 도시환경개선 및 정주여건 조성

❑ 사업장 전경사진

김천시 구읍지구 사업전

김천시 구읍지구 사업후
